delaware

GROUPE BEAUMANOIR

ERP Achat/Vente

Proposition n°38319288909



2025 © delaware

delaware

tour de table



Eric Hiernaux

Associé, delaware
Email : eric.hiernaux@delaware.pro
Phone : +33 6 10 38 23 96



Xavier Arnaudin

Lead Expert, delaware
Email : xavier.arnaudin@delaware.pro
Phone : +33 7 43 36 61 39



Denis Kervédou

Sales, delaware
Email : denis.kervedou@delaware.pro
Phone : +33 6 80 28 30 19



Thomas Le Driant

Sales, delaware
Email : thomas.ledriant@delaware.pro
Phone : +33 6 83 74 06 85

agenda


1. contexte & enjeux
2. nos convictions sur la solution SAP
3. la cinématique projet
4. le périmètre projet
5. le périmètre solution
6. dimensionnement projet
7. perspectives

1. contexte & enjeux



contexte beaumanoir
« innovation & transformation »

- Croissance soutenue & diversification des marques
- Modèles multiples (wholesale, franchise, affiliés)
- Un marché très concurrentiel
- Des équipes IT fortement mobilisées
- Une entreprise inclusive & engagée (internalisation, RSE)

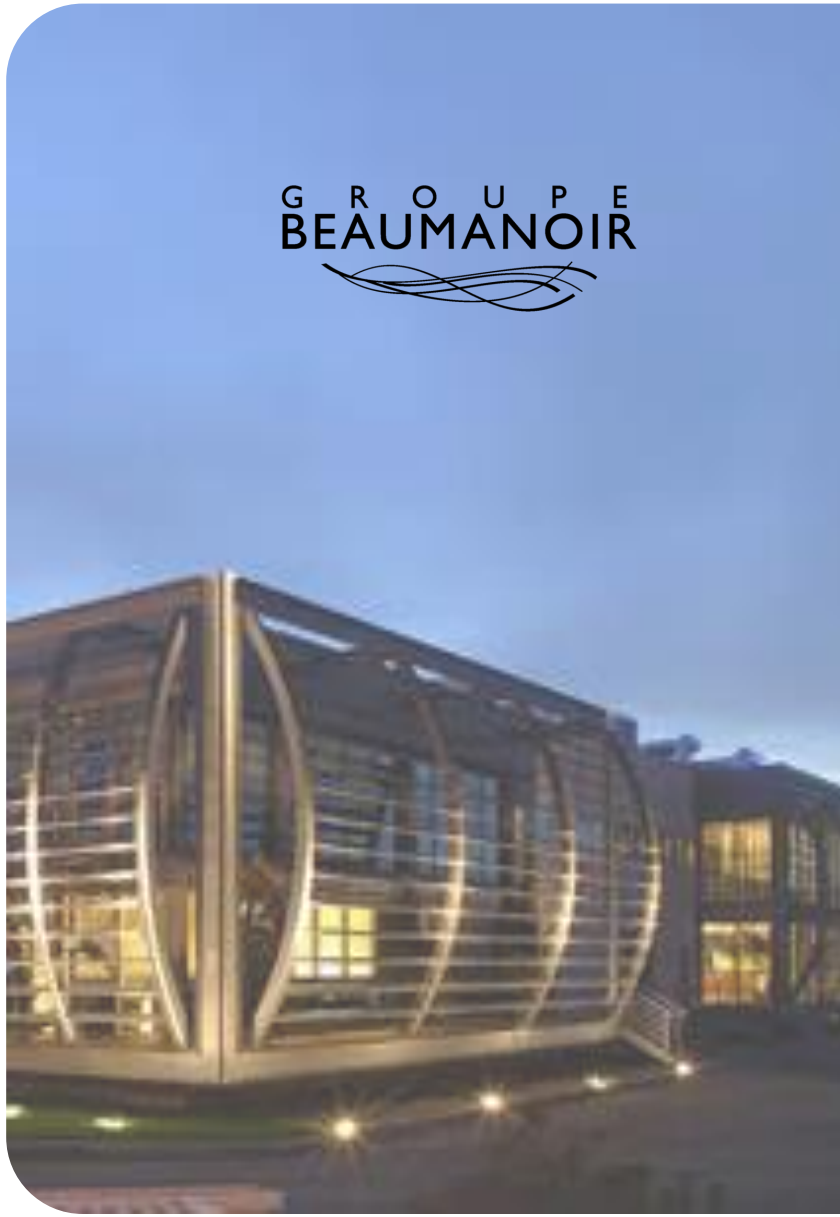


Beaumanoir x delaware
« notre actualité commune »

Étude avancée de migration Finance vers Rise
(décision fin 2025)

RFI en cours sur la faisabilité de SAP S/4
(Achats / Ventes et Finance – Beaumanoir & Boardriders)

Deux TMA actives : Finance & BI

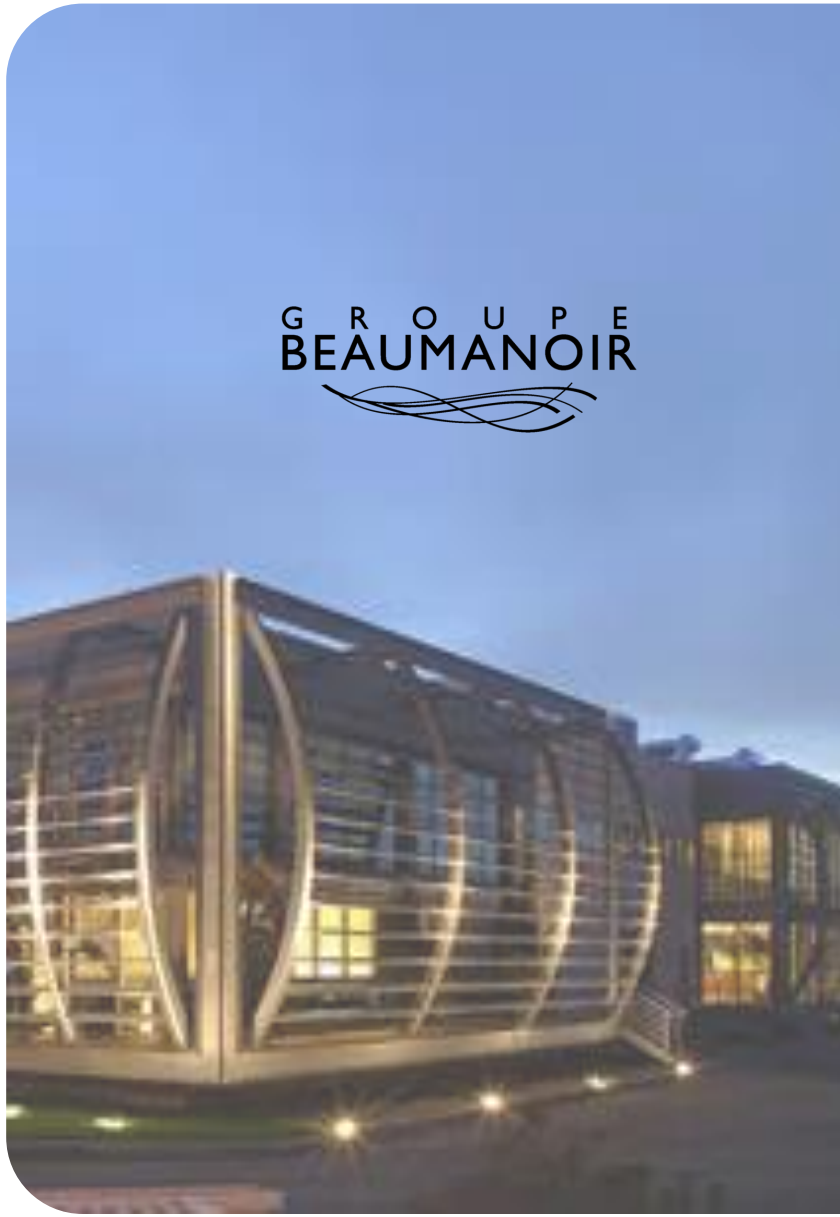

notre engagement RSE

we care, we respect, we enable.

people

Prendre soin de nos parties prenantes, c'est créer une atmosphère de travail **inclusive** pour les #peopleofdelaware et être un acteur à part entière des **communautés** dans lesquelles nous évoluons.

planet

Respecter la planète, c'est sensibiliser les #peopleofdelaware sur l'**impact** de nos activités de l'ensemble de notre chaine de valeur tout en mesurant notre **empreinte carbone** pour améliorer notre performance environnementale.

profit

S'engager à aider nos clients à utiliser le numérique comme levier de la durabilité, c'est les **accompagner dans leur changement** avec des **solutions innovantes** de consolidation, de suivi et d'optimisation.

> Nous pensons que nous pouvons **avoir un impact positif sur notre environnement**, tout en **permettant à nos employés, à notre entreprise et à nos clients d'atteindre leur plein potentiel**.



Claire Kravtchenko
Associée Sponsor RSE

10 400 tCO_2 eq

* notre bilan carbone pour la France en 2023

100 000 €

par an investis

pour des projets sportifs, solidaires et environnementaux

en 2025…

- déployer notre politique diversité & inclusion
- réduire de notre empreinte carbone
- investir dans des solutions innovantes IT for Green




2. nos convictions sur la solution SAP

SAP Retail
une solution qui répond à vos enjeux

- **Unifier & consolider** : une base unique pour toutes les activités (manufacturing, wholesale, retail).
- **Piloter centralement** : une vision financière consolidée sur l'ensemble des entités.
- **Intégrer Fashion & Retail** : production et distribution connectées.
- **Optimiser** :
  - la production grâce aux prévisions (wholesale + retail)
  - la promesse client avec une gestion intelligente des priorités.

Accompagner votre croissance et renforcer votre performance.

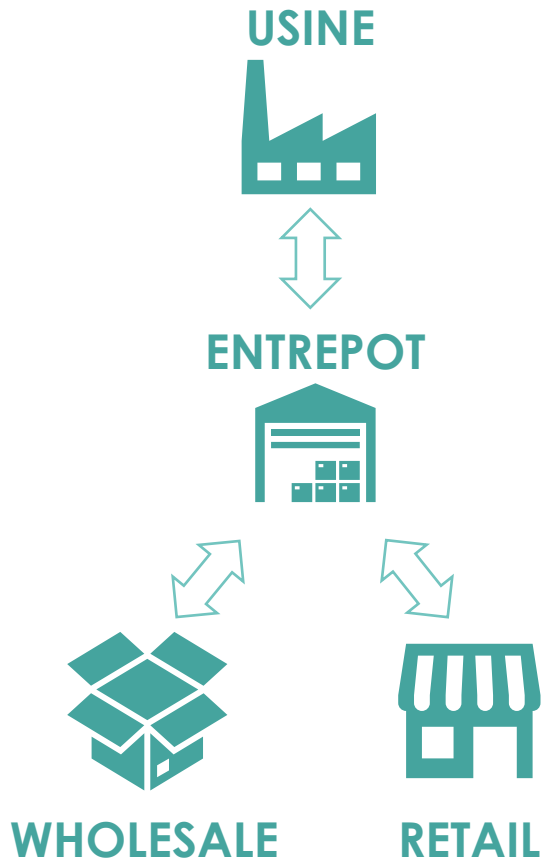


SAP Retail
le trait d'union Achat – Vente – Finance



1. **Centraliser** : un seul système pour les flux achats & ventes.
2. **Piloter par la demande** : ajuster la promesse client selon les contraintes d'appro.
3. **Automatiser la finance** : gestion native des stocks, facturation et comptabilité générale.
4. **Renforcer l'analytique** : une base unique pour croiser achats, ventes et finance.

Gagner en efficacité : moins de tâches manuelles, moins d'interfaces.

une vision d'une solution intégrée **achat/vente/finance**

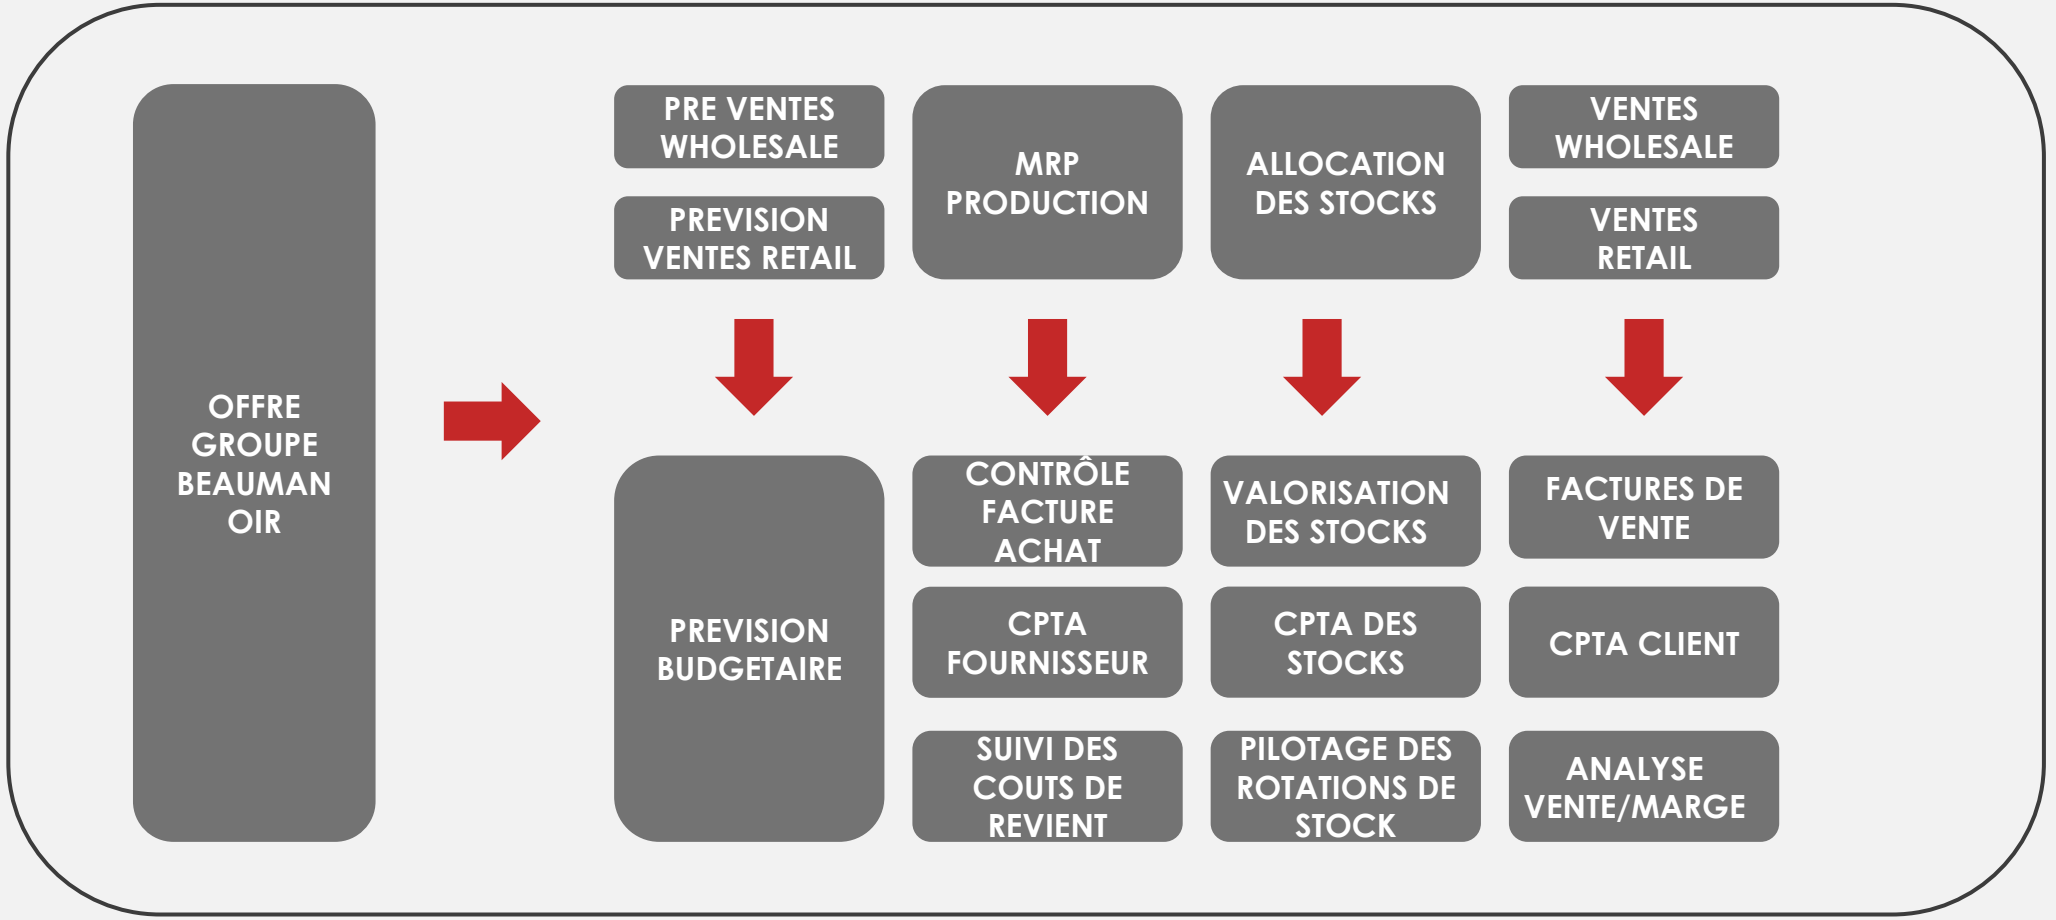

3. la cinématique projet



cinématique projet
une approche progressive et structurée

- **Migration vers SAP S/4** : iso-fonctionnelle + lift & shift RISE, pour créer **le socle du futur projet Achats / Ventes.**

- **Outils métiers spécialisés** : intégration de solutions dédiées à la distribution (S&OP, remontée des ventes, OMS).

Une trajectoire qui sécurise l'existant tout en préparant **les fondations de la transformation future.**



cinématique projet
en 3 phases projets

Upgrade système Groupe Beaumanoir

Implémentation Boardriders
et construction du Core Model Groupe Beaumanoir

Déploiement Beaumanoir
sur les processus Fashion/ Retail / Wholesale



cinématique projet
la situation à la fin de chaque lot

Aujourd'hui	Lot 1	Lot 2	Lot 3
Beaumanoir SAP ECC FINANCE + VISTEX	**Beaumanoir** SAP S/4 Finance (et CCM)	**Beaumanoir** SAP S/4 Finance **Boardriders** Core Model SAP S/4 Finance & Retail Fashion	**Beaumanoir** **Boardriders** SAP S/4 Finance & Retail Fashion
Boardriders SAP AFS + Finance	**Boardriders** SAP AFS + Finance		

Instances on Prem

Instance RISE

4. le périmètre projet

compréhension des enjeux métiers

Centraliser les processus métiers
Proposer un outil commun pour gérer l'ensemble des activités wholesale, fashion et retail

Optimiser la gestion des collections et des stocks complexes
Piloter efficacement la gestion de la supply chain, les collections saisonnières et les stocks multi variants (taille, couleur, style).

Accélérer le time-to-market
Réduire les délais entre la conception produit et la mise en marché pour gagner en réactivité.



flux cible bout en bout pressenti

Source to Contract

- Négociation
- Contractualisation
- Suivi et évaluation

Master Data to Offer

- Gestion catalogue produit
- Promotion et assortiment
- Segmentation stocks

Order-To-Cash – 1e partie

- Prise de commande / pré commande
- Captation commandes de vente WHL & retail
- Consolidation et forecast

Purchase to Pay

- Gestion des conditions d'achat et RFA
- Commandes d'achat et réception
- Contrôle facture et paiement fournisseur

Schedule to Produce

- MRP
- Gestion ordres de production
- S&OP

Order to Cash - Fin

- Gestion des allocations de stock avec pénurie
- Exécution des commandes de vente WHL & retail
- Gestion paiement client

Finance to control

- Comptabilité fournisseur
- Connectivité multi bancaire
- Comptabilité client
- Comptabilité générale
- Comptabilité des actifs
- Trésorerie
- Gestion notes de frais
- Gestion royalties

Gestion entrepôt et transport

- Gestion des stocks et mvts de stock
- Gestion des opérations entrepôt
- Optimisation des transports

Gestion des magasins

- Gestion des stocks et mvts de stock
- Gestion de la vente / encaissement
- Moteur de replenishment magasin

Chiffré dans RFI

Hors Chiffrage

5. le périmètre solutions

couverture fonctionnelle cible SAP détaillée

Nous reprenons dans ces slides les principaux processus de bout en bout et les solutions SAP qui y répondent en indiquant si nous avons inclus ou pas la mise en place de ces solutions dans le cadre de notre macro-estimation.

Processus	Solution principale	Inclus?	Fonctionnalités
Reprend les processus End-to-End	La solution SAP qui couvre tout ou partie du processus	Si c'est inclus, la solution est chiffrée dans la BOM SAP et dans l'estimation globale du projet.	Quelques lignes expliquant pourquoi cette solution est intéressante pour Beaumanoir

Processus	Solution principale	Inclus?	Fonctionnalités
Finance-to-control	S/4 FICO	✓	**Comptabilité générale :** S/4HANA GL prend en charge les Gaap locaux avec un plan comptable unifié. **Comptabilité client / fournisseurs :** S/4 AR / AP sont totalement intégrés aux processus logistiques **Comptabilité des stocks** : S/4HANA Inventory Management et Material Ledger gèrent l'évaluation des stocks et le calcul des coûts. **Comptabilité des actifs :** Le système de projet S/4HANA et la comptabilité des actifs gèrent l'acquisition et le cycle de vie des actifs. **Trésorerie :** SAP Basic Cash Management couvre les paiements et l'intégration bancaire.

Processus	Solution principale	Inclus ?	Fonctionnalités
Finance-to-control	SAP Ariba	✗	Avoir des processus d'achats indirects communs à tous les pays.
Finance-to-control	SAP Multi bank connectivity	✗	Pour vous connecter à vos différentes banques et supports formats standards
Finance-to-control	SAP Vendor Invoice Management	✗	Traite de bout en bout le rapprochement des factures.
Finance-to-control	SAP Concur	✗	Pour gérer les dépenses et notes de frais
Finance-to-control	SAP DRC	✓	Pour le reporting réglementaire et la facturation électronique dans plus de 185 pays, avec un seul cockpit pour la conformité.

Processus	Solution principale	inclus?	Fonctionnalités
Master Data & Offer	S/4 Fashion MM	✓	Saison, collection et segmentation logique et physique
Forecast-to-Produce	S/4 Fashion PP	✗	Pour les processus de production, y compris les caractéristiques spécifiques à la mode.
Forecast-to-Produce	S/4 Basic EWM	✗	Pour les processus logistiques des matières premières.
Forecast-to-Produce	SAP IBP	✓	Pour bénéficier d'un MRP multisite

Processus	Solution principale	Inclus?	Fonctionnalités
Purchase-to-Pay	Tbd	✗	Pour remplacer SNC et digitaliser les échanges fournisseurs, un outil apte à gérer les besoins spécifiques des tiers.
Purchase-to-Pay	S/4 Fashion MM	✓	Pour soutenir l'ensemble du processus Purchase to Pay, y compris les spécifications liées à la mode.
Order-to-Cash	SAP Vistex / CCM	?	Pour calculer les commissions et les services en magasin.

Processus	Solution principale	Inclus?	Fonctionnalités
Order-to-Cash	SAP OMSA	✓	Pour traiter les fonctions essentielles d'un OMS en lien natifs avec l'Available to Promise de S/4
Order-to-Cash	S/4 TM	✗	Pour séquencer le transport et en contrôler les coûts.
Order-to-Cash	SAP CAR Allocation Management	✗	Le module pour calculer et optimiser l'implant initial et le réappro magasins.

Processus	Solution principale	Inclus?	Fonctionnalités
Order-to-Cash	S/4 Fashion SD	✓	Traiter le processus de commande wholesale.
Order-to-Cash	S/4 Allocation Management	✓	Gérer la segmentation des articles, la gestion des pénuries, l'allocation des produits et la hiérarchisation des canaux.

Processus	Solution principale	Inclus?	Pourquoi?
Gestion du magasin	S/4 Back Office Management	✓	Pour gérer les processus du magasin tels que les stocks, les retours, etc.
Middleware	SAP Integration Suite	✗	Unification de l'intégration des processus

6. dimensionnement projet

notre méthode de chiffrage



estimation du budget
basée sur une analyse fonctionnelle détaillée

Level	Domain	Process ID	Scope		Solution	Lot 1 - Finance & Flux direct & Portail adhérent	Lot 2 - Supply & flux plateforme
1	65	65.	**Order to cash**	-			
2	65	65.05	**Develop sales policies**	-			
3	65	65.05.010	Develop order management policie	- 4.2.8	paramètres gestion de commande (gérés via API)	Out of scope	3
3	65	65.05.020	Manage sales channels	-		Out of scope	Out of scope
3	65	65.05.030	Define customer classifications	- 1.4	Catégorie client	Out of scope	2
3	65	65.05.040	Develop sales catalogs	- 1.3.1	Catalogue	Out of scope	2
3	65	65.05.050	Develop sales pricing strategy	- 4.2.8		Out of scope	3
3	65	65.05.060	Define trade allowances	- 1.3.2	Journaux Accords Co.	Out of scope	3
3	65	65.05.070	Define risk management strategy	-	ACNT	Out of scope	Out of scope
3	65	65.05.090	Define accounts receivable strateg	-		Out of scope	Out of scope
3	65	65.05.100	Define credit and collections strate	2.12.3 -	Le module Crédit et Relance	2	Out of scope
2	65	65.20	**Manage sales orders**	-			
3	65	65.20.015	Sell product subscriptions	-		Out of scope	Out of scope
3	65	65.20.025	Enter sales orders	- 1.3.2		Out of scope	2
3	65	65.20.045	Manage blanket sales orders	- 1.3.2		Out of scope	2
3	65	65.20.100	Manage sales order changes	- 4.2.6 /!\ -->	Pas d'interco, flux de marchandises sans facture donc pas d'interco	Out of scope	2
3	65	65.20.200	Manage sales order holds	- 4.2.8	commandes en attente de franco (géré via API)	Out of scope	1
3	65	65.20.300	Manage store operations	-		Out of scope	Out of scope
3	65	65.20.400	Process customer returns and excha	- 4.2.10		Out of scope	3
3	65	65.20.500	Cancel sales orders	-		Out of scope	2
3	65	65.20.600	Allocate inventory to sales orders	-		Out of scope	2
2	65	65.30	**Manage accounts receivable**	-			

Matrice de décomposition remplie à partir de l'appel d'offres

Liste des éléments de processus
avec des degrés de complexité

Estimation de l'effort de travail
pour chaque processus et chaque phase du projet

Estimation de la charge de travail
par phase fonctionnelle et par phase de projet

les inducteurs de chiffrage




chiffres clés de l'estimation budgétaire




processus

- lot 2 : 142
- lot 3 : 82



Objet reprise de données


- lot 2 : 32
- lot 3 : 31



interfaces

- lot 2 : 41
- lot 3 : 37

le niveau de complextié

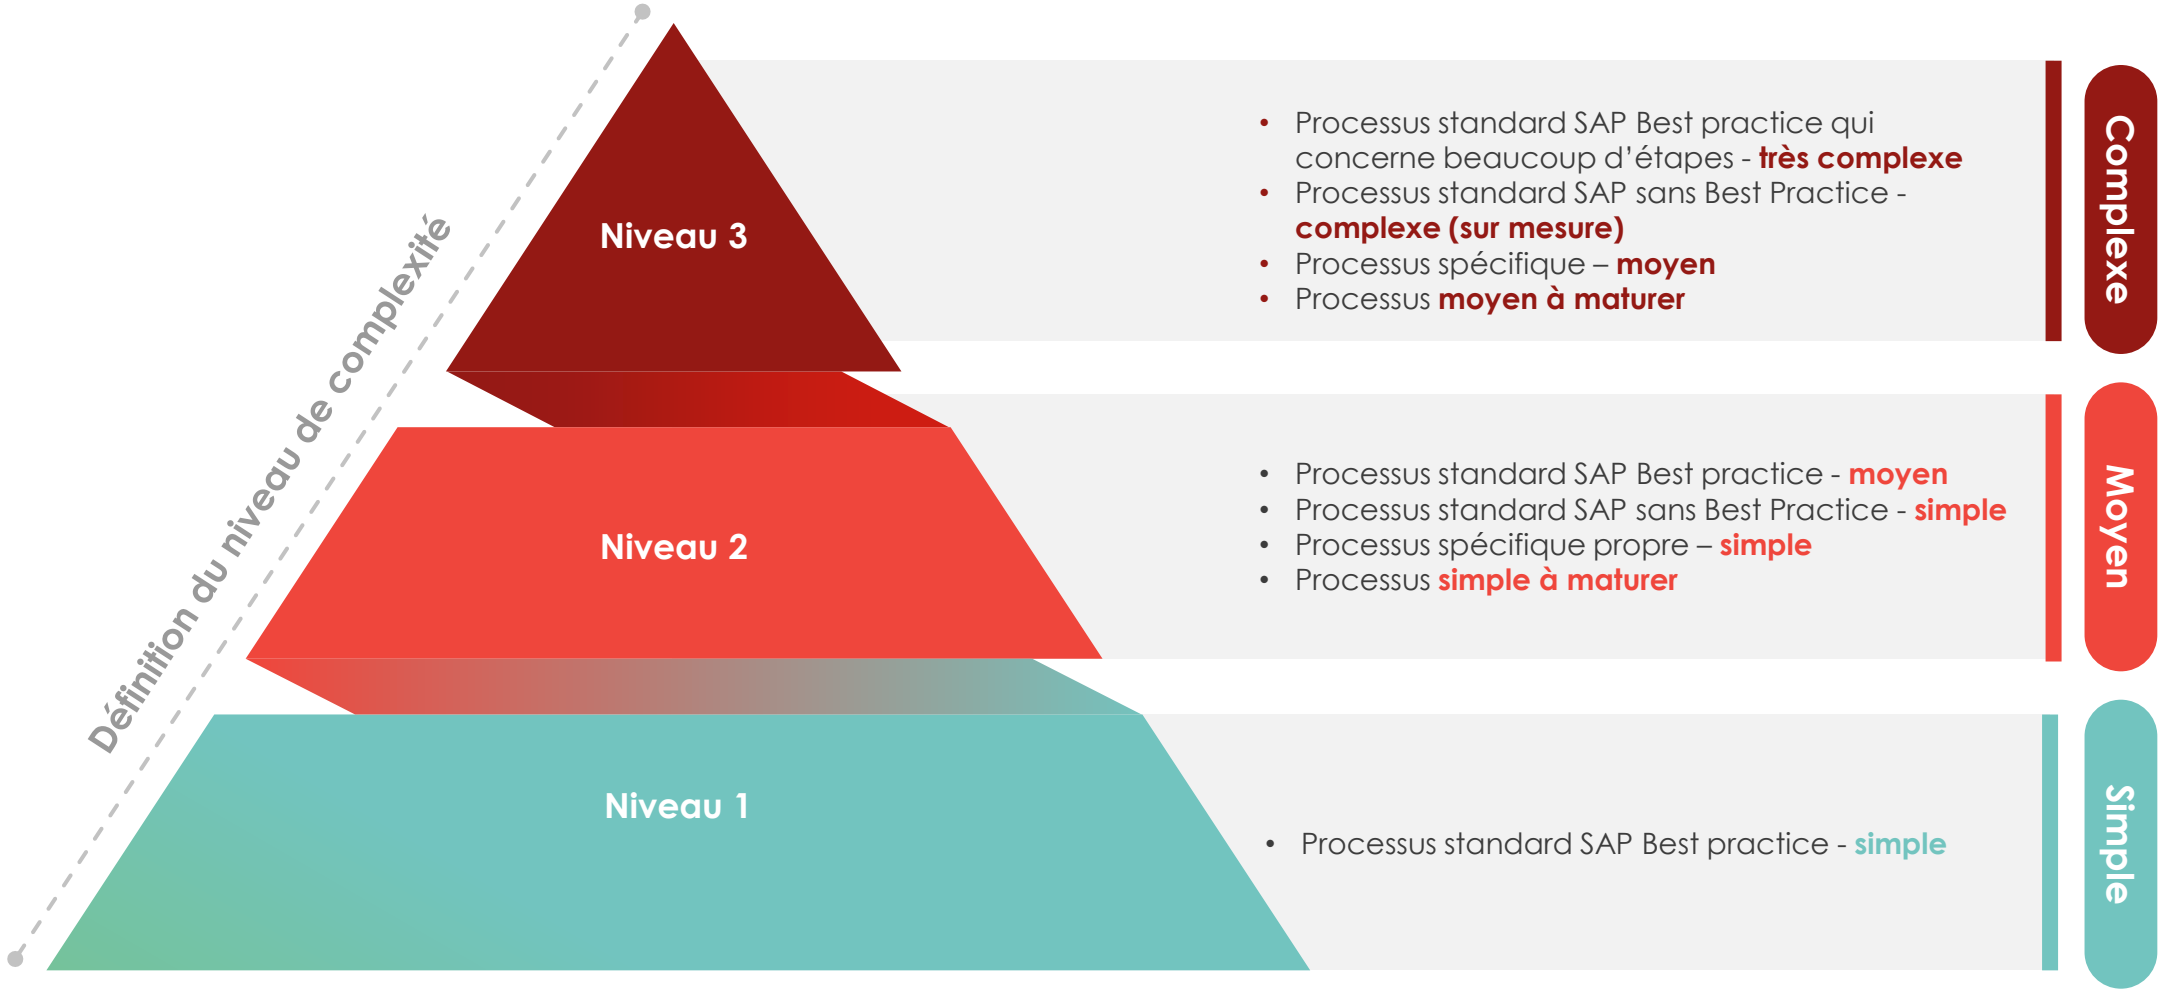

la méthode de calcul

Level	Domain	ID	Processus	Nombre de variantes	Conception Globale	Lot 1 - Vente & finance societé commerciale + Holding	Lot 2 - Achat , Production
1	4	04	**Vente des Biens et Services**				
2	4	04.01	**Données de Bases Vente**				
3	4	04.01.01	Gestion Clients		2	2	Hors Périmètre
3	4	04.01.02	Gestion des Prix de Vente et de Cession		3	3	Hors Périmètre
2	4	04.02	**Flux simples du processus de Vente**				
3	4	04.02.01	Vente sur Stock BTB		3	3	Hors Périmètre
3	4	04.02.02	Vente d'Articles non Stockés avec Fabrication sur Commande BTB		Hors Périmètre	Hors Périmètre	Hors Périmètre
3	4	04.02.03	Vente d'Articles non Stockés avec Achat sur Commande BTB		Hors Périmètre	Hors Périmètre	Hors Périmètre
3	4	04.02.04	Vente d'Articles configurable CTO		Hors Périmètre	Hors Périmètre	Hors Périmètre
3	4	04.02.05	Vente d'Articlesd'ingénérie ETO		Hors Périmètre	Hors Périmètre	Hors Périmètre
2	4	04.03	**Stratégie de ventes/négociations**				
3	4	04.03.01	Gestion des Prix de Vente et de Cession		2	2	Hors Périmètre
3	4	04.03.03	Gestion des demandes d'offre		2	2	Hors Périmètre
3	4	04.03.04	Gestion des Devis		2	2	Hors Périmètre
3	4	04.03.05	Gestion des Contrats de Vente	2	2	2	Hors Périmètre
3	4	04.03.06	Extended Sales Contract Management		2	2	Hors Périmètre
3	4	04.03.07	Traitement des remises sur les ventes		3	3	Hors Périmètre
2	4	04.04	**Processus des Ventes spéciaux (fusionné avec 04.07)**				
3	4	04.04.01	Traitement des Articles Gratuits		1	1	Hors Périmètre
3	4	04.04.02	Vente directe à partir d'un fournisseur avec Notification d'Expédition		Hors Périmètre	Hors Périmètre	Hors Périmètre
3	4	04.04.03	Traitement des Commandes de Vente retour		2	2	Hors Périmètre
3	4	04.04.04	Traitement des Commandes de Vente avec Liste de Facture et Facturation Groupée		1	1	Hors Périmètre

Abaques pour chaque phase en fonction de la méthodologie projet et des activités déjà réalisées

Calcul de la charge par phase, par domaine ou chantier

les budgets prestations

estimation budget globale

Phase	Budget en € HT
Lot 1 - Upgrade solution Beaumanoir vers S/4	400 000 €
Lot 2 - Implémentation Boardriders sur S/4	7 800 000 €
Lot 3 - Déploiement Beaumanoir (+ Gaps)	5 300 000 €
Type de prestations - Post phase de stabilisation	**Budget en € HT**
RISE	1 270 000 €
Maintenance en conditions opérationnelles	250 000 €
Monitoring des flux en horaires étendus	450 000 €
TMA Evolutive	350 000 €

estimation budget & charges globales

Le budget projet et la charge interne sont estimés sur base de notre BPML et d'expériences similaires.

Il prend en compte notre connaissance de Boardriders et du Groupe Beaumanoir. Et cela ne présage en rien une proposition commerciale liée à un RFP projet.

Phase Projet	J.H delaware	Budget €T	J.H interne
Lot 1 - Upgrade	421 j.h	395 000 €	218 j.h
Lot 2 - Core Model Boardrider	8446 j.h	7 768 577 €	8 034j.h
Lot 3 - Beaumanoir	5 773 j.h	5 298 775 €	5 741 j.h
Total	**14 640 j.h**	**15 462 352 €**	**13 393 j.h**

charges lot 2 – Transformation Boardriders

		Initiate		Explore		Execute			Deploy		Run	
Domain	**Desciption**	**Prep**	**Plan**	**Inception**	**Blueprint**	**Real.**	**SIT**	**UAT**	**Final Prep**	**Go Live**	**Operate**	**Total**
	Durée (en mois)	1	1	2	2	6	2	2	3	2	0	**21**
1	Business structure and guidelines	3 j.h	10 j.h	15 j.h	13 j.h	53 j.h	13 j.h	21 j.h	14 j.h	6 j.h	4 j.h	**152 j.h**
2	Manage product lifecycle	2 j.h	13 j.h	18 j.h	25 j.h	64 j.h	13 j.h	28 j.h	20 j.h	5 j.h	4 j.h	**192 j.h**
3	Market goods & services	2 j.h	12 j.h	37 j.h	73 j.h	176 j.h	57 j.h	65 j.h	42 j.h	27 j.h	28 j.h	**517 j.h**
4	Sell Goods and Services	19 j.h	95 j.h	149 j.h	242 j.h	630 j.h	156 j.h	245 j.h	172 j.h	69 j.h	59 j.h	**1835 j.h**
5	Procure Goods and Services	7 j.h	41 j.h	60 j.h	93 j.h	241 j.h	54 j.h	97 j.h	69 j.h	23 j.h	19 j.h	**704 j.h**
6	Plan supply of Goods	6 j.h	33 j.h	62 j.h	134 j.h	333 j.h	91 j.h	111 j.h	82 j.h	44 j.h	41 j.h	**936 j.h**
7	Produce Goods	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
8	Execute Supply Chain	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
9	Manage Quality	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
10	Manage Financial Process	11 j.h	41 j.h	173 j.h	137 j.h	638 j.h	51 j.h	176 j.h	74 j.h	14 j.h	7 j.h	**1323 j.h**
11	Manage Financial Planning and Analysis	6 j.h	32 j.h	95 j.h	102 j.h	247 j.h	36 j.h	125 j.h	54 j.h	9 j.h	8 j.h	**713 j.h**
Sous total		**57 j.h**	**278 j.h**	**608 j.h**	**819 j.h**	**2380 j.h**	**471 j.h**	**867 j.h**	**526 j.h**	**196 j.h**	**170 j.h**	**6371 j.h**
	Reprise des données (Data mig)	0 j.h	0 j.h	7 j.h	0 j.h	165 j.h	165 j.h	22 j.h	22 j.h	22 j.h	0 j.h	**401 j.h**
	Copilote IA											**0 j.h**
	Formations	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
	Tests	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	9 j.h	3 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**12 j.h**
Sous total		**0 j.h**	**0 j.h**	**7 j.h**	**0 j.h**	**165 j.h**	**173 j.h**	**25 j.h**	**22 j.h**	**22 j.h**	**0 j.h**	**413 j.h**
	Gouvernance	10 j.h	5 j.h	74 j.h	98 j.h	305 j.h	77 j.h	107 j.h	66 j.h	26 j.h	20 j.h	**789 j.h**
	Coordination Fonctionnelle	8 j.h	2 j.h	31 j.h	41 j.h	127 j.h	32 j.h	45 j.h	27 j.h	11 j.h	8 j.h	**332 j.h**
	Support Infrastructure (BC)	3 j.h	2 j.h	10 j.h	20 j.h	60 j.h	40 j.h	40 j.h	40 j.h	20 j.h	10 j.h	**245 j.h**
	Coordination Additionnelle si GDC	1 j.h	7 j.h	15 j.h	20 j.h	127 j.h	32 j.h	45 j.h	27 j.h	11 j.h	8 j.h	**295 j.h**
Total par phases		**79 j.h**	**294 j.h**	**745 j.h**	**998 j.h**	**3165 j.h**	**825 j.h**	**1128 j.h**	**709 j.h**	**286 j.h**	**217 j.h**	**8446 j.h**

charges lot 3 – Transformation GBM

		Initiate		Explore		Execute			Deploy		Run	
Domain	**Desciption**	**Prep**	**Plan**	**Inception**	**Blueprint**	**Real.**	**SIT**	**UAT**	**Final Prep**	**Go Live**	**Operate**	**Total**
	Durée (en mois)	0	1	1	2	5	2	2	2	2	0	**17**
	Domain											
1	Business structure and guidelines	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
2	Manage product lifecycle	2 j.h	8 j.h	9 j.h	2 j.h	31 j.h	5 j.h	10 j.h	7 j.h	3 j.h	1 j.h	**78 j.h**
3	Market goods & services	2 j.h	8 j.h	16 j.h	24 j.h	72 j.h	21 j.h	28 j.h	17 j.h	9 j.h	9 j.h	**207 j.h**
4	Sell Goods and Services	15 j.h	67 j.h	112 j.h	194 j.h	530 j.h	140 j.h	179 j.h	132 j.h	68 j.h	58 j.h	**1495 j.h**
5	Procure Goods and Services	8 j.h	25 j.h	31 j.h	26 j.h	142 j.h	29 j.h	41 j.h	32 j.h	16 j.h	8 j.h	**358 j.h**
6	Plan supply of Goods	11 j.h	41 j.h	56 j.h	94 j.h	306 j.h	73 j.h	90 j.h	73 j.h	36 j.h	28 j.h	**808 j.h**
7	Produce Goods	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
8	Execute Supply Chain	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
9	Manage Quality	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
10	Manage Financial Process	3 j.h	11 j.h	49 j.h	21 j.h	174 j.h	14 j.h	44 j.h	18 j.h	4 j.h	2 j.h	**341 j.h**
11	Manage Financial Planning and Analysis	6 j.h	22 j.h	50 j.h	47 j.h	178 j.h	24 j.h	63 j.h	32 j.h	7 j.h	5 j.h	**433 j.h**
12	Manage Plant Maintenance	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
17	Retail Store Operations	8 j.h	41 j.h	55 j.h	65 j.h	191 j.h	32 j.h	85 j.h	56 j.h	11 j.h	6 j.h	**548 j.h**
Sous total		**56 j.h**	**222 j.h**	**379 j.h**	**474 j.h**	**1623 j.h**	**339 j.h**	**539 j.h**	**367 j.h**	**154 j.h**	**116 j.h**	**4269 j.h**
	Reprise des données (Data mig)	0 j.h	0 j.h	7 j.h	0 j.h	127 j.h	127 j.h	15 j.h	15 j.h	15 j.h	0 j.h	**304 j.h**
	Copilote IA											**0 j.h**
	Formations	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
	Tests	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	0 j.h	**0 j.h**
Sous total		**0 j.h**	**0 j.h**	**7 j.h**	**0 j.h**	**127 j.h**	**127 j.h**	**15 j.h**	**15 j.h**	**15 j.h**	**0 j.h**	**304 j.h**
	Gouvernance	10 j.h	5 j.h	46 j.h	57 j.h	210 j.h	56 j.h	66 j.h	46 j.h	20 j.h	14 j.h	**530 j.h**
	Coordination Fonctionnelle	8 j.h	2 j.h	19 j.h	24 j.h	87 j.h	23 j.h	28 j.h	19 j.h	8 j.h	6 j.h	**225 j.h**
	Support Infrastructure (BC)	3 j.h	2 j.h	10 j.h	20 j.h	60 j.h	40 j.h	40 j.h	40 j.h	20 j.h	10 j.h	**245 j.h**
	Coordination Additionnelle si GDC	1 j.h	6 j.h	10 j.h	12 j.h	87 j.h	23 j.h	28 j.h	19 j.h	8 j.h	6 j.h	**200 j.h**
Total par phases		**78 j.h**	**236 j.h**	**470 j.h**	**587 j.h**	**2195 j.h**	**609 j.h**	**716 j.h**	**506 j.h**	**226 j.h**	**151 j.h**	**5773 j.h**

Focus sur les WRICEFs

Typologie de Dev	Lot 2	Lot 3
Conversion	137 j.h	67 j.h
Enh / Exits / Badi	169 j.h	134 j.h
Report	134 j.h	84 j.h
Input	473 j.h	282 j.h
output	358 j.h	354 j.h
Forms	168 j.h	109 j.h
Fiori	294 j.h	227 j.h

WRICEFS : Workflows, Reports, Interfaces, Conversion des données, Enhancements (personnalisation du standard) Forms (documents générés par Sap.

les budgets SAP

BOM licences

La BOM est basée sur les besoins perçus dans le cadre de la grille fonctionnelle.

Pour votre facilité, nous détaillons nos hypothèses, les budgets approximatifs unitaires et ce que cela donne en budget annuel remisé.

Ceci n'est pas une offre validée par SAP.

Désignation de la souscription licence activée	Quantité Année 1	Quantité Année 2	Quantité Année 3	Quantité Année 4	Quantité Année 5
SAP S/4HANA Cloud for fashion and vertical business, private edition - (8012632)	1	1	1	1	1
SAP S/4HANA Cloud foundation for retail and fashion, private edition - (8012633)	10	30	30	80	80
SAP Cloud, memory extension for non-productive tiers, private edition - (8011727)	1	2	6	8	8
SAP Cloud, memory extension for productive tiers, private edition - (8011726)	1	2	6	8	8
SAP Addit File Storage, priv cld ed - (8008794)	12	12	12	12	12
SAP Omnichannel Sales Transfer and Audit - (8018957)	5	70	70	440	440
SAP Integrated Business Planning for response and supply – (8015923)	1	1	1	1	1
SAP Order Management for sourcing and availability is a solution – (8012655)	1	21	21	21	21
DRC					
BTP Voucher	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Digital Access - (8008678)	2476	2476	2476	0	0
FUE - (8019361)	136	136	167	167	167
AI Units - (8019164)	25	25	25	25	25
DRP	17%	17%	17%	17%	17%

BOM licences en Euros HT

Les montants unitaires remisés par an, au LEP

Désignation de la souscription licence activée	Montant Année 1
SAP S/4HANA Cloud for fashion and vertical business, private edition - (8012632)	65 000 €
SAP S/4HANA Cloud foundation for retail and fashion, private edition - (8012633)	482 €
SAP Cloud, memory extension for non-productive tiers, private edition - (8011727)	10 900 €
SAP Cloud, memory extension for productive tiers, private edition - (8011726)	20 500 €
SAP Addit File Storage, priv cld ed - (8008794)	834 €
SAP Omnichannel Sales Transfer and Audit - (8018957)	750 €
SAP Integrated Business Planning for response and supply – (8015923)	44 500 €
SAP Order Management for sourcing and availability is a solution – (8012655)	1 020 €
DRC	
BTP Voucher	inclus
Digital Access - (8008678)	27.06 €
FUE - (8019361)	2 647 €
AI Units - (8019164)	264 €
DRP	17%
Maintenance Boardrider	135 000 €

BOM licences en Euros HT

Estimation des budgets annuels licences tenant compte de la roadmap hors CPI.

Ce budget de licence englobe la partie finance.

Désignation de la souscription licence activée	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
SAP S/4HANA Cloud for fashion and vertical business, private edition - (8012632)	65 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
SAP S/4HANA Cloud foundation for retail and fashion, private edition - (8012633)	4 820 €	14 460 €	14 460 €	38 560 €	38 560 €
SAP Cloud, memory extension for non-productive tiers, private edition - (8011727)	10 900 €	21 800 €	65 400 €	87 200 €	87 200 €
SAP Cloud, memory extension for productive tiers, private edition - (8011726)	20 500 €	41 000 €	123 000 €	164 000 €	164 000 €
SAP Omnichannel Sales Transfer and Audit - (8018957)	3 750 €	52 500 €	52 500 €	330 000 €	330 000 €
SAP Integrated Business Planning for response and supply – (8015923)	44 500 €	44 500 €	44 500 €	44 500 €	44 500 €
SAP Order Management for sourcing and availability is a solution – (8012655)	1 020 €	21 420 €	21 420 €	21 420 €	21 420 €
DRC	71 550 €	71 550 €	71 550 €	71 550 €	71 550 €
BTP Voucher	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Digital Access - (8008678)	67 001 €	67 001 €	67 001 €	0 €	0 €
FUE - (8019361)	359 992 €	359 992 €	442 049 €	442 049 €	442 049 €
AI Units - (8019164)	6 600 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
DRP	110 336 €	129 068 €	164 370 €	214 927 €	214 927 €
Maintenance Boardrider ERP	135 000 €				
Totaux	**790 633 €**	**765 823 €**	**973 480 €**	**1 270 879 €**	**1 270 879 €**

Merci de votre attention



we commit. we deliver.

delaware

we commit. we deliver.
